

INFORMACIJA NEPRIKLAUSOMAM ŠILUMOS GAMINTOJUI


UAB „LITESKO“ filialas „Biržų šiluma“

1. Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotas vidutinis metinis galios poreikis bei metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje:

Rotušės – Kaštonų katilinių integruotas šilumos tinklas:


Galia/Metai	2015 m	2016 m	2017 m
MWvid.	3,2	3,3	3,3
MWmax.	10,3	10,7	10,4

Paskutinių trijų kalendorinių metų fiksuoti šilumos tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai, MW

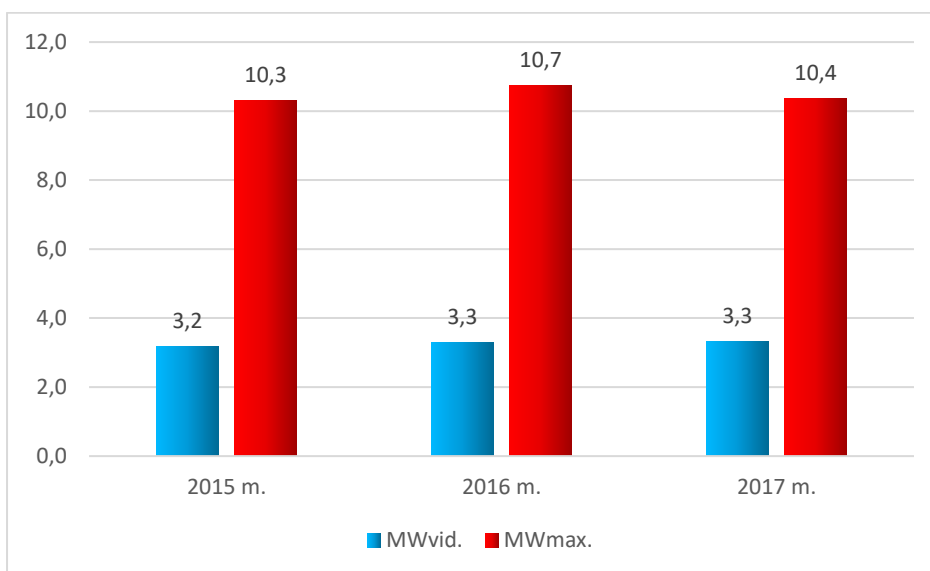


(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)

2017 m. šilumos tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

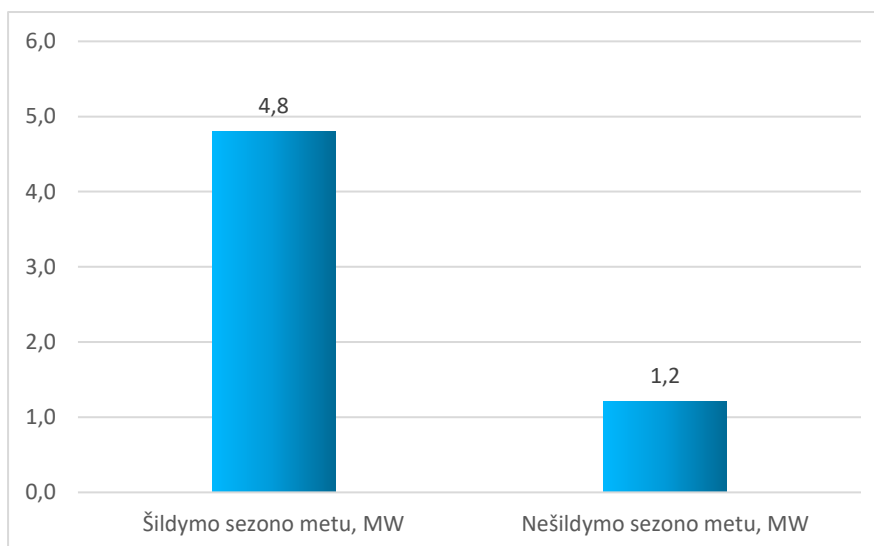

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.)

2. (8.2. p.) Prie šilumos perdavimo tinklo prijungti ir planuojami prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltiniai, jų vieta, galia (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį;

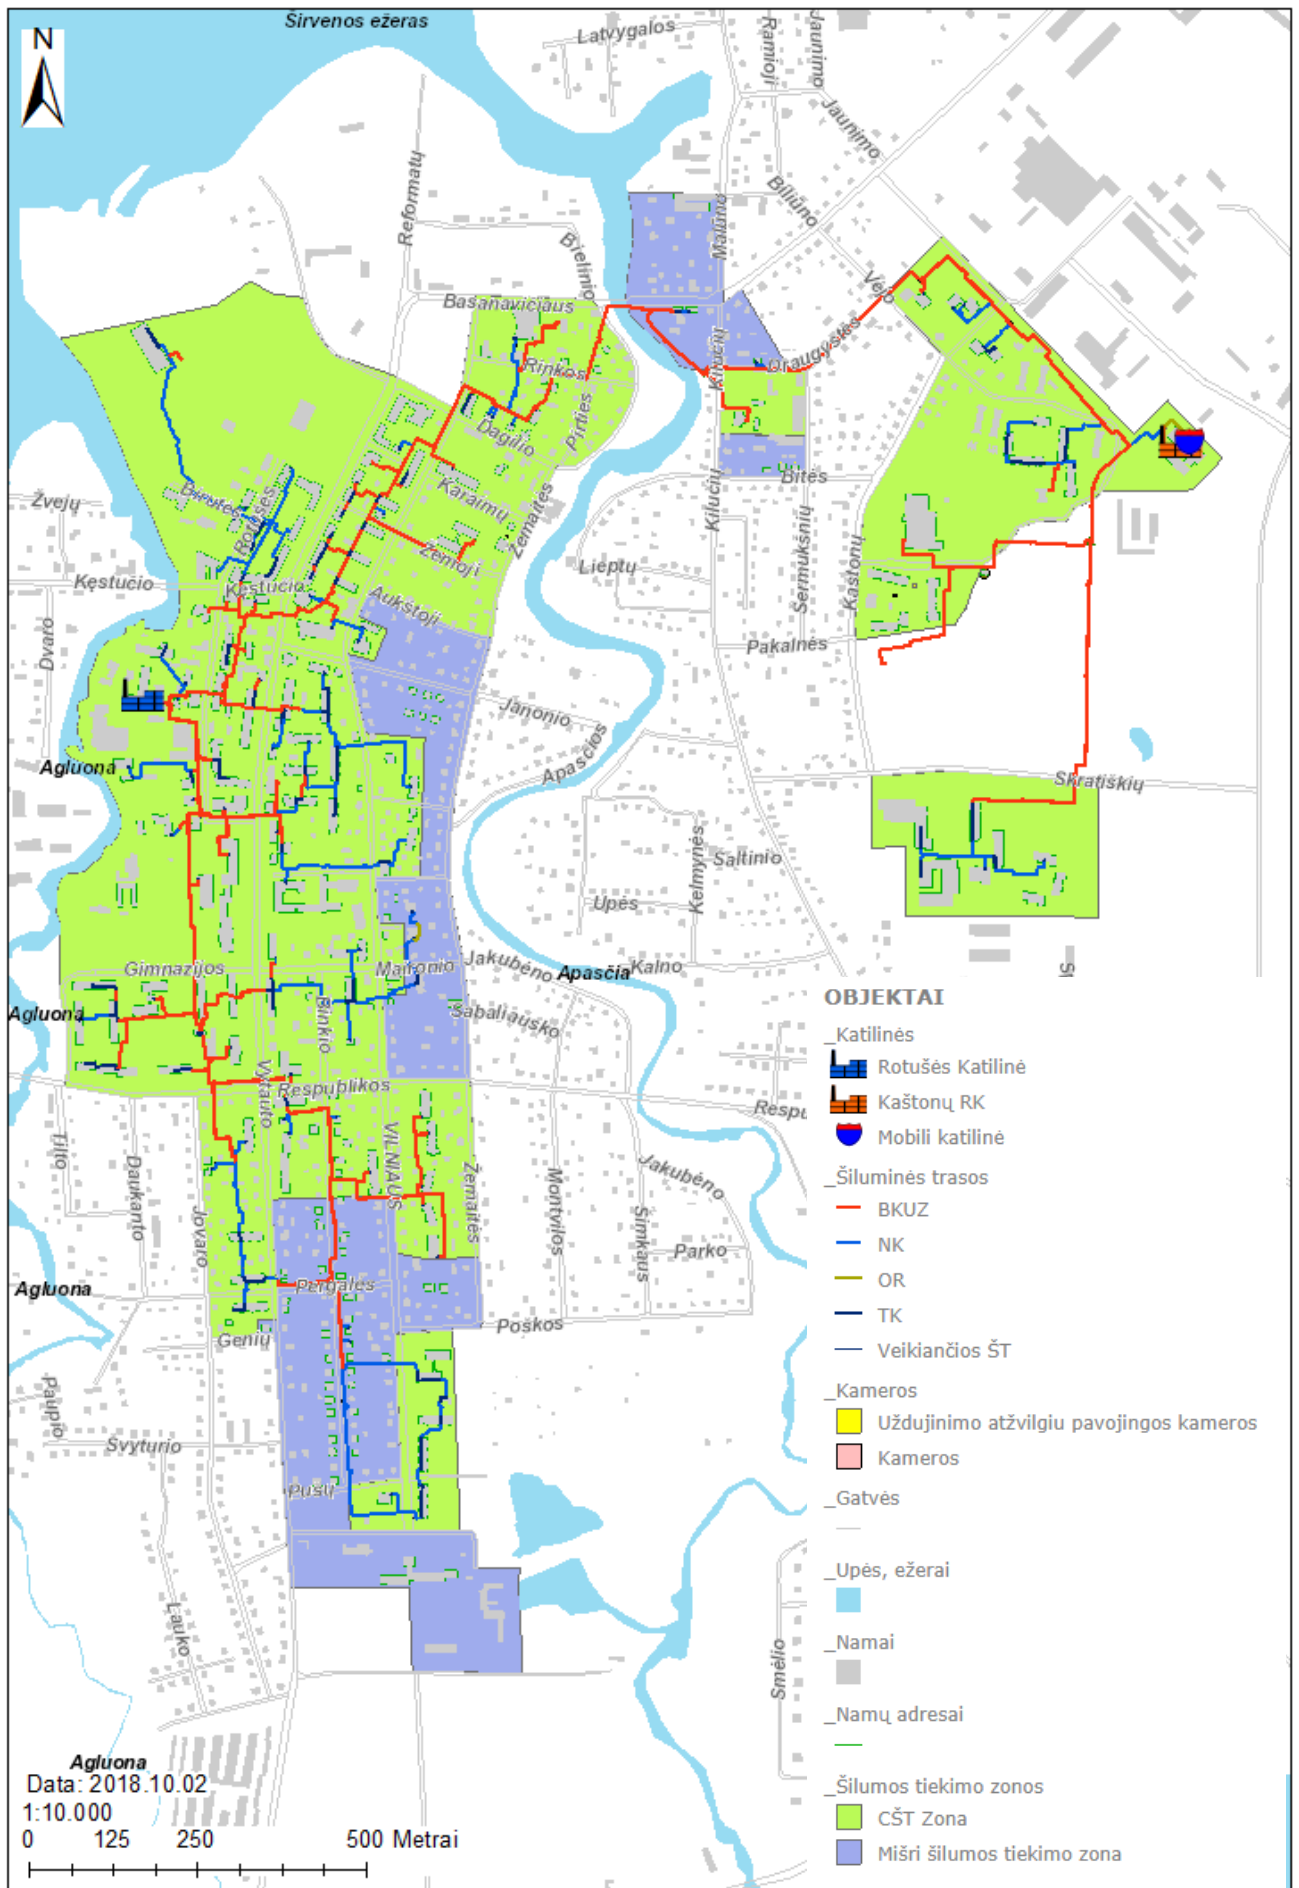

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas, 27.8 punktas)

NE ŠILDYMO SEZONO METU

Rajoninės katilinės temperatūrinis grafikas:

T1¹°C	T2³°C	G² m³/h
69	40	20÷60

Režiminė korta:

PARAMETRAS				Pastaba
Slėgis prisijungimo taške	Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1)	bar	3,7	Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar
	Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)	bar	2,7	

ŠILDYMO SEZONO METU

Rajoninės katilinės temperatūrinis grafikas:

T1¹°C	T2³°C	G² m³/h
69÷85	40÷46	114÷240

Režiminė korta

PARAMETRAS			Leist. nuokrypos		Pastaba
			nuo	iki	
Slėgis prisijungimo taške	Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1)	bar	Kaštonų RK 5,0 Rotušės RK 4,1	Kaštonų RK 6,0 Rotušės RK 4,1	Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar
	Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)	bar	Kaštonų RK 1,8 Rotušės RK 2,7	Kaštonų RK 1,8 Rotušės RK 2,7	

¹Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p. 793 termofikacinio vandens tiekimo temperatūros (T1) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5°C.

³ Grįžtamos temperatūros (orientacinės). Priklauso nuo šilumos punktų darbo.

² Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas:

Nešildymo sezono metu. (šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo vartotojų poreikio).

Šildymo sezono metu.(šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo oro sąlygų ir vartotojų poreikio).

3. Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas.

(Vadovaujantis „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 70 p. aprašu)

Preliminarus šilumos tinklų hidraulinių bandymų grafikas 2019 m.

Eil. Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo ... iki)	Data	HB ar remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Remonto, š. tinklų ir kt. darbų grupės vadovas	Iš kur bandoma
1	ŠUL-104 iki ŠK-204a su atšakomis į Vytauto g. 18,22,31,32,33,33a,33b,35a,39,39a,39b,39c,43, 43a,47 Janonio g. 2, Vilniaus g. 39a,49, Rotušės g. 19, 25, 28	2019.05.09	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-204-3-2
2	Rotušės kt. iki ŠK-204c su atšakomis į Vytauto g. 24, Rotušės g. 23,24,24b,26	2019.05.14	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rotušės g. 24
3	ŠK-204c iki Vytauto g. 61 su atšakomis į Rotušės g. 30, Vytauto g. 32a, 38, 59, 61, ŠK-205-2, Respublikos 56.	2019.05.14	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Boilerinė Nr. 1
4	ŠUL-205-2 iki Gimnazijos 3,5,7,9, Respublikos g. 58, 62	2019.05.14	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Gimnazijos g. 5
5	Gimnazijos g. 1 iki Vilniaus g. 55a, su atšakomis į Vytauto g. 36,49,51,53, Vilniaus g. 40a, 46a,55a,57a,61a,65, Maironio g. 4	2019.05.16	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Vilniaus g. 40a
6	ŠUL-209-1 iki ŠUL-210 su atšakomis į Jovaro g. 7, Vytauto g. 42,56,60,62.	2019.05.16	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-222a
7	Vytauto g. 61 iki ŠK-222a su atšakomis į ŠK-218a, Vytauto g. 63,65, Binkio g. 11	2019.05.16	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-222a
8	ŠK-218a iki Vilniaus g. 56, 77a,77b,91a,93a,99a	2019.05.21	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠUL-218a
9	ŠK-222a iki ŠK-230 su atšakomis į Binkio g. 37, 39.	2019.05.21	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-222a
10	ŠK-230 iki Vilniaus g. 113 su atšakomis į Vilniaus g. 92	2019.05.23	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Boilerinė Nr. 2
11	ŠK-230 iki Vilniaus g. 109,111,111a,113	2019.05.23	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-236
12	Kaštonų katilinė iki ŠK-2	2019.05.28	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Kaštonų katilinė
13	ŠK-2 iki Skratiškių g. 8	2019.05.28	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Skratiškių g. 8
14	Skratiškių g. 8 iki Skratiškių g. 6(valgykla), 6(dirbtuvės), 6(mokomasis), 10.	2019.05.28	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Skratiškių g. 8
15	Skratiškių g. 10 iki ŠK-2-7, Skratiškių g. 12	2019.05.28	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Skratiškių g. 8
16	ŠUL-2-3 iki Kaštonų g. 13, 27	2019.05.28	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Kaštonų katilinė

17	ŠK-2 iki ŠK-7	2019.05.30	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Vėjo g. 22
18	ŠK-3 iki Vėjo 26b,26,26a,24,22,22a,	2019.05.30	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Vėjo g. 22
19	ŠK-4 iki Vėjo 11a,11b. ŠK-5 iki 9c,9b. ŠK-7a iki vėjo7b,a	2019.05.30	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Vėjo g. 22
20	ŠK-7 iki ŠUL-10-2 su atšakomis į Draugystės g. 1, Basanavičiaus g. 16, 18 ,Kilučių g. 11	2019.06.04	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-7
21	ŠUL-10-2 iki ŠK-23 su atšakomis į Dagilio g. 1,3,5a. Janonio a. 7	2019.06.04	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠUL-10-2
22	ŠK-18 iki Basanavičiaus 4,4b, Karaimų g. 5	2019.06.04	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠUL-10-2
23	ŠK-23 iki ŠK-109 su atšakomis į Vytauto g. 9,11,13,15,17,19,21,23,27 Karaimų g. 1, Vilniaus g. 4,6,8,10,12, Žemoji g. 1,9	2019.06.06	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Žemoji g. 9
24	ŠK-109 iki ŠK-101 su atšakomis į ŠUL-104, Kęstučio g. 1,4,5,6, Rotušės g. 13,14,15,17,16a, 18, 20a, Vytauto g. 14a.	2019.06.11	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	ŠK-102
25	Rinkuškių 1 šiluminė trasa	2019.06.13	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių 1 katilinės
26	Rinkuškių 2 šiluminė trasa	2019.06.13	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių 2 katilinės
27	Rinkuškių 3 šiluminė trasa	2019.06.13	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių 3 katilinės
28	Rinkuškių 4 šiluminė trasa	2019.06.18	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių 4 katilinės
29	Rinkuškių 5 šiluminė trasa	2019.06.18	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių 5 katilinės
30	Rinkuškių 6-7 šiluminė trasa	2019.06.20	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių 6 katilinės
31	Rinkuškių darželis "Rugelis" šiluminė trasa	2019.06.20	1	Hidraulinis bandymas ir šil. tinklų einamasis remontas	Dainius Žižmaras	Rinkuškių darželio katilinės
